

Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна

(подпись)

03.03.2020






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА


"(Е1-78) Современная школа (Ярославская область)"


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Сведения не представлены</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года
Всего: 450 504,50 тыс. руб

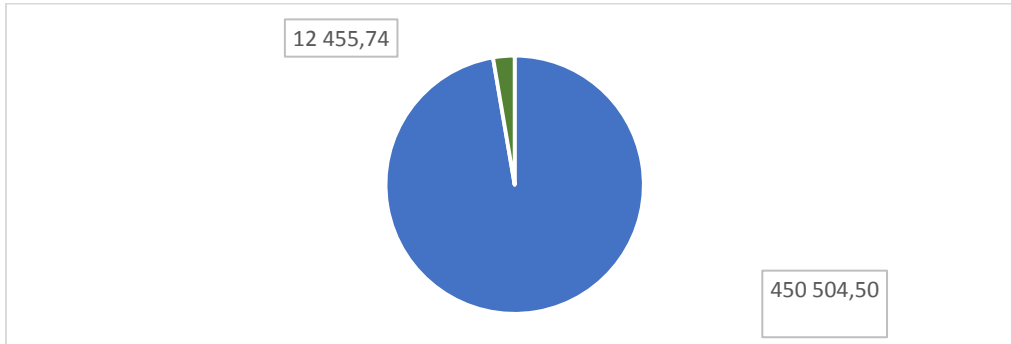

Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года
Всего: 450 504,50 тыс. руб

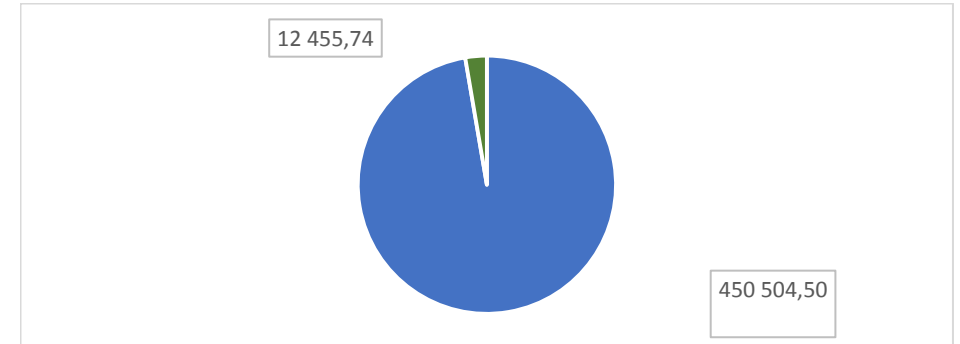

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

■ Фактически исполнено
 ■ Риски исполнения
 ■ Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.


■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 ■ Сведения не представлены
 ▨ Прогнозные сведения


Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярославской области Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	19 087,93	19 087,93	19 087,93	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19 087,93	19 087,93	19 087,93	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	19 087,93	19 087,93	19 087,93	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(03) Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	67 916,46	67 916,46	67 916,46	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	67 916,46	67 916,46	67 916,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	67 916,46	67 916,46	67 916,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(21) Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	363 500,11	363 500,11	363 500,11	363 500,11	13 111,3	3,6	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	363 500,11	363 500,11	363 500,11	363 500,11	13 111,3	3,6	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100 144,30	100 144,30	100 144,30	100 144,30	3 612,16	3,6	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	345 325,10	345 325,10	345 325,10	345 325,10	12 455,74	3,6	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	363 500,11	363 500,11	363 500,11	363 500,11	13 111,3	3,6	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			450 504,5	450 504,5	450 504,5	363 500,11	13 111,3	2,9	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			450 504,5	450 504,5	450 504,5	363 500,11	13 111,3	2,9	
бюджет субъекта Российской Федерации			187 148,69	187 148,69	187 148,69	100 144,30	3 612,16	1,9	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			345 325,10	345 325,10	345 325,10	345 325,10	12 455,74	3,6	
бюджеты муниципальных образований			363 500,11	363 500,11	363 500,11	363 500,11	13 111,3	3,6	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Астафьева С. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.
2.1			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	31.05.2020	Астафьева С. В.	В работе.
2.1.1	РФП		Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации	31.05.2020	31.05.2020	Астафьева С. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНИП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей				
3			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярославской области Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 2, на дату 31.12.2020	31.12.2020	30.03.2020	Астафьева С. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.
3.2	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	30.08.2020	30.03.2020	Пиленкова И. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства Просвещения Российской Федерации и Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-328,






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл.
3.2.1	РПП		Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	28.02.2020	20.12.2019	Пиленкова И. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства Просвещения Российской Федерации и Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-328, приложен файл.
3.2.2	РПП		Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	28.02.2020	13.03.2020	Пиленкова И. Н.	В работе. Просрочка 14 дней. Существует риск: Перенесение сроков размещения извещений, Причина риска: Согласование инфраструктурного листа завершилось 28.02.2020, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Размещение извещений в скорректированный срок, срок исполнения 13.03.2020.
3.2.3	РПП		Представление информации об объемах операционных расходов на функционирование коррекционных школ	31.12.2019	30.03.2020	Пиленкова И. Н.	В работе. Просрочка 90 дней. Существует риск: Отсутствие запроса на предоставление информации, Причина риска: Информация об объемах операционных расходов не запрашивалась, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Предоставление информации по запросу, срок исполнения 30.03.2020.
4			Обновлена материально-техническая база для	31.12.2020	13.03.2020	Астафьева С. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0.042 из 0.042.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

12

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.042, на дату 31.12.2020				
4.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.08.2020	13.03.2020	Астафьева С. В.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Инфраструктурный лист" Иной вид документа Департамента образования Ярославской области от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл.
4.2.1	РРП		Определен перечень	30.11.2019	28.02.2020	Пиленкова И. Н.	Выполнено. Просрочка 90 дней. Подтверждающие документы: 1.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.













№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации				"Инфраструктурный лист" Иной вид документа письмо Департамента образования Ярославской области от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл.
4.2.2	РПП		Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центров	28.02.2020	13.03.2020	Пиленкова И. Н.	В работе. Просрочка 14 дней. Существует риск: Перенос сроков размещений извещений, Причина риска: Согласование инфраструктурного листа прошло 28.02.2020 , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 13.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Предоставление информации в скорректированный срок, срок исполнения 13.03.2020.
4.3	РПП		Закупка включена в план закупок	28.02.2020	18.02.2020	Астафьева С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медиазоны для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа»" Иной вид документа Государственного казенного учреждения Ярославской области Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области от 18.02.2020г. №б/н, указана ссылка.
4.4	РПП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	28.02.2020	20.12.2019	Астафьева С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства Просвещения Российской Федерации и Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-328, приложен файл.

4.4.1	РРП		Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	28.02.2020	20.12.2019	Астафьева С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении сусидии" Соглашение Министерства Просвещения Российской Федерации и Правительства Ярославской области от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-328, приложен файл.
-------	-----	--	--	------------	------------	-----------------	---


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
 РНП - руководитель национального проекта.


-  Отсутствие отклонений
-  Наличие отклонений
-  Наличие критических отклонений
-  Сведения не представлены
-  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2019	Астафьева С. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 70 из 70.
5.2	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	31.12.2024	31.05.2019	Астафьева С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о проведении вебинара" Прочий тип документа Департамента образования Ярославской области от 24.05.2019г. №ИХ.24-3848_


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 975, на дату 31.12.2020	31.12.2020	23.12.2019	Черневский А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 975 из 975.
7.4	РРП		Техническая готовность объекта, %	31.12.2020	23.12.2019	Черневский А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации" Иной вид документа Департамента строительства Ярославской области от 23.12.2019г. №24-12583, приложен файл.
7.4.1	РРП		Техническая готовность объекта капитального строительства, находящегося по адресу Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Тракторная д.12 составляет 35%	31.12.2019	23.12.2019	Черневский А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации" Иной вид документа Департамента строительства Ярославской области от 23.12.2019г. №24-12583, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

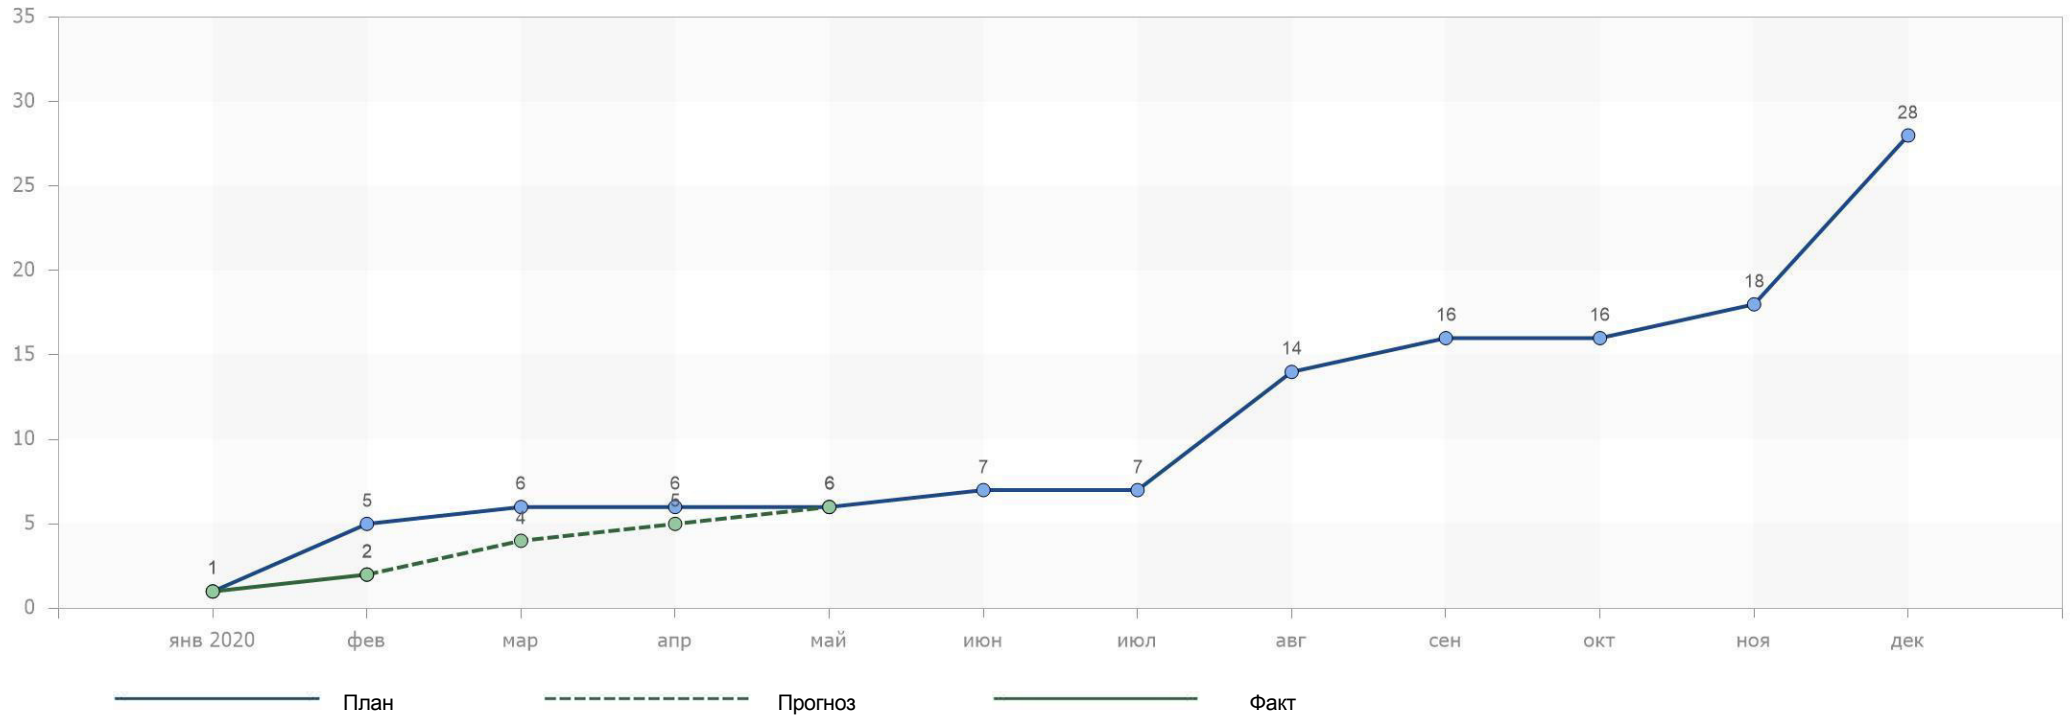


Рис. 1. "(Е1-78) Современная школа (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

